

福島第一原子力発電所現地確認報告書


- 1 確認日
平成30年 5月 2日 (水)
- 2 確認箇所
G1南タンクエリア
- 3 確認項目
G1南タンクエリアタンク設置工事の進捗状況
- 4 確認結果の概要
G1南タンクエリアにおける溶接型タンク設置工事の進捗状況を確認した。
 - ・タンクの据付は、計画数23基に対して20基と前回確認時（平成30年1月22日）と変化がなかった。（写真1）
 - ・前回確認時には設置されていなかった鋼製仮堰（高さ約20cm）が据付済タンクの全周に設置されていた。（写真2）
 - ・エリアの南側では移送配管の敷設工事が進められていた。（写真3）



(写真1)



(写真2)

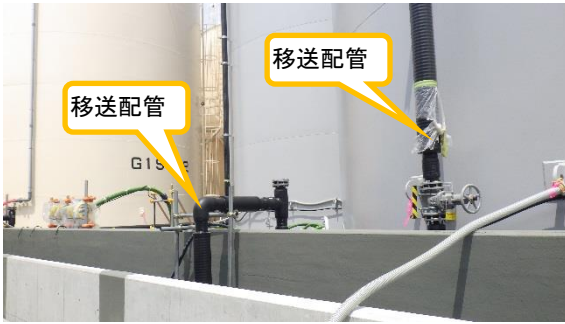

(写真3)

5 プラント関連パラメータ確認

各パラメータについて、前日と比べ有意な変動は確認されなかった。
