

田付川筋【喜多方市】

福島吾妻裏磐梯線【猪苗代町】

令和4年8月3日からの大雨に伴う 災害復旧の進捗状況



福島県土木部
令和6年3月31日現在

杉田川筋【安達郡大玉村】

宮古川筋【喜多方市】

災害復旧事業全体の進捗状況（令和6年3月31日現在）

工種	査定箇所数 (箇所)	着工箇所数 (箇所)	着工率 (%)	完了箇所数 (箇所)	完了率 (%)
道路	24	21	87.5	14	58.3
橋梁	1	0	0.0	0	0.0
河川	87	87	100.0	79	90.8
合計	112	108	96.4	93	83.0

災害復旧事業の進捗状況について（道路）

福島吾妻裏磐梯線（若宮3号）

耶麻郡猪苗代町大字若宮地内

復旧延長	71.0m
復旧概要	舗装工
進捗率	100.0%



施工前

至 福島市



令和5年12月完了

至 福島市



災害復旧事業の進捗状況について（道路）

福島吾妻裏磐梯線（若宮5号）

耶麻郡猪苗代町大字若宮地内

復旧延長	49.0m
復旧概要	舗装工
進捗率	100.0%



施工前

至 福島市



令和5年12月完了

至 福島市



災害復旧事業の進捗状況について（河川）

杉田川筋

安達郡大玉村大山字川原2号地内

復旧延長

51.0m

復旧概要

積ブロック工

進捗率

100.0%



施工前



令和5年8月完了



災害復旧事業の進捗状況について（河川）

杉田川筋

安達郡大玉村大山字前皿久保地内

復旧延長


17.0m

復旧概要

積ブロック工

進捗率

100.0%

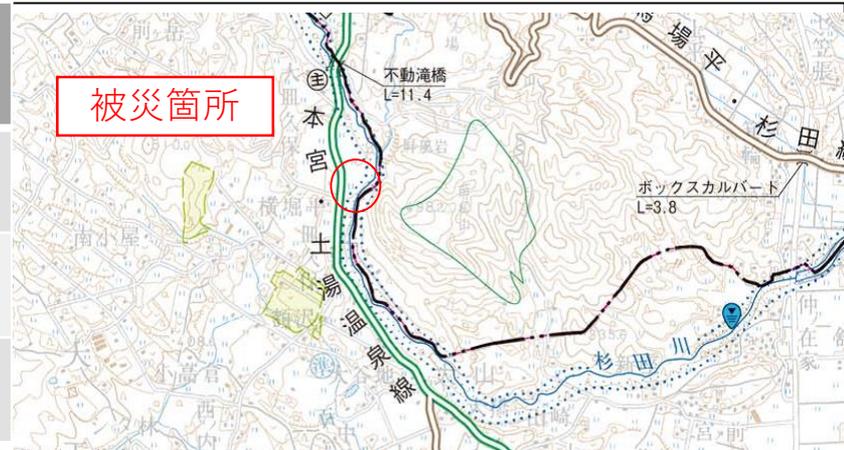

施工前



令和5年8月完了



災害復旧事業の進捗状況について（河川）

濁川筋

喜多方市熱塩加納町加納字朴林甲地内

復旧概要

護岸工

進捗率

100.0%



施工前



令和5年11月完了



災害復旧事業の進捗状況について（河川）

一ノ戸川筋

喜多方市山都町一ノ木地内

復旧概要

護岸工

進捗率

100.0%



施工前



令和5年11月完了



災害復旧事業の進捗状況について（河川）

田付川筋

喜多方市岩月町入田付字駒形地内

復旧概要

護岸工

進捗率

100.0%



施工前



令和5年12月完了



災害復旧事業の進捗状況について（河川）

宮古川筋

喜多方市山都町蓬莱字半三作地内

復旧概要

護岸工

進捗率

100.0%



施工前



令和6年2月完了

