

令和元年東日本台風等からの復旧状況を伝える

復旧・復興だより(夏井川)



福島県いわき建設事務所

1 地域のみなさまへ 夏井川の改良復旧事業について、お知らせします。

令和元年東日本台風の甚大な被害に対応するため、夏井川では令和2年11月末に破堤箇所の復旧工事が完了し、「狭窄部の伐木掘削工事」(10箇所)に着工しており、令和3年9月末までには8箇所が完了しています。

また、事業区間を全14工区に分割して発注する「本格的な掘削工事」についても4~9工区と12~14工区で着工しています。(1~3工区、10, 11工区は令和3年10月着工予定)

2 工事進捗状況について

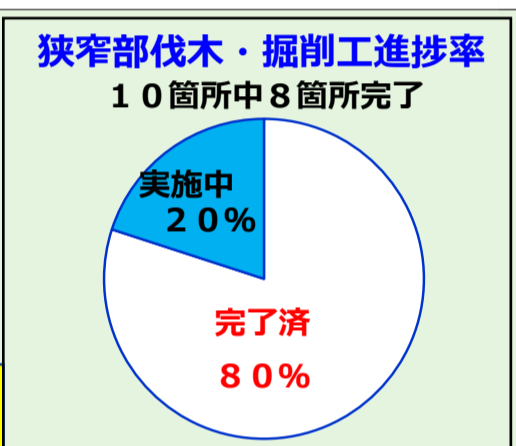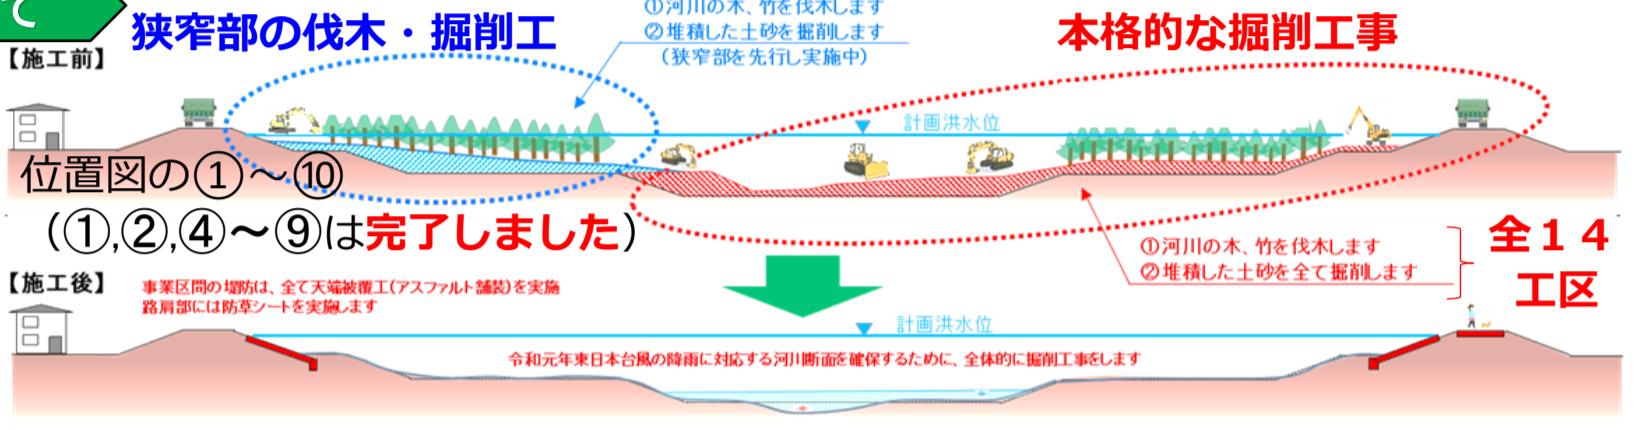

狭窄部伐木・掘削工の状況

3 工事の見通しについて

項目	令和元年度 4月 10月 3月	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	備考
破堤箇所 応急仮工事	■					
破堤箇所 本復旧工事			●			令和2年11月末に完了済み
狭窄部の 伐木・掘削工事			■			8箇所が完了済み 特に河道が狭くなっている箇所を先行して掘削します。 全14工区中9箇所発注済
本格的な 掘削工事				■		助成区間の河道全域
護岸工事					■	本格的な掘削工事箇所のうち水衝部等
用地買収					■	

4 本格的な掘削工事 夏井川では、狭窄部の掘削工事に引き続き、本格的な掘削工事を進めています。



工事の進捗に伴いダンプトラック等の通行が増加しております。今後も増加を見込んでおり、ご不便をおかけしますが、早期の工事完了のため、ご理解とご協力をお願いします。



お問い合わせ

福島県いわき建設事務所

企画管理部企画調査課復興まちづくり係 電話：0246-24-6143
ホームページアドレス <http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41380a/>

