

【いわき市と川内村を結ぶバイパス工事の進み具合をお知らせします。】

工事の進捗率 (令和元年11月末現在)

59.1 %

十文字工区バイパス計画延長6.2kmのうち、県施工延長L=2.9kmの工事進捗割合を表しております。




施工状況

現在、道路改良工事と橋梁1橋を施工中です。

今月は、内倉湿原1号橋における桁架設工事の状況及び内倉湿原2号橋の橋名板についてお知らせします。

内倉湿原1号橋

1 橋桁の架設が完了し、桁と桁の間に設置するPC床版を設置しています。

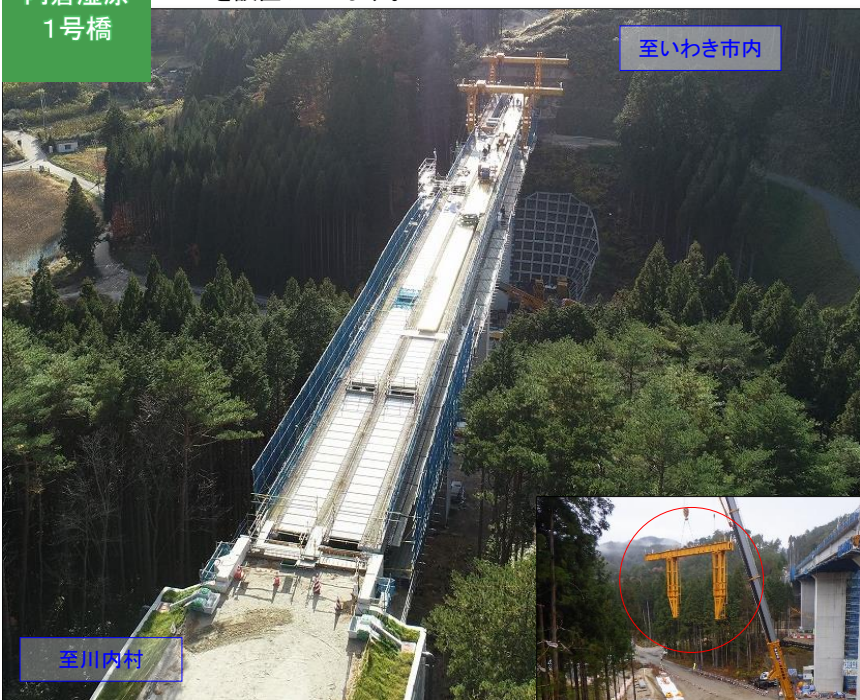

桁架設後、門型架設機械は撤去しました。

内倉湿原2号橋

2 2号橋の橋名板を揮毫して頂いた地元住民の方を現場に招待しました。



完成した内倉湿原2号橋。



揮毫して頂いた荒木さん(左)と松本区長さん(右)



完成した橋名板
