


労働環境改善スケジュール

分野	括り	作業内容	これまで1ヶ月の動きと今後1ヶ月の予定	9月				10月				11月				12月		1月	備考	
				24	1	8	15	22	29	5	12	19	下	上	中	下	期	後		
防護装備	1	防護装備の適正化検討	(実績) ・管理対象区域の運用区分及び放射線防護装備の適正化検討※ ・管理対象区域の運用区分に応じた放射線防護装備の適正化の運用開始(2016年3月8日)	検討・設計 管理対象区域の運用区分及び放射線防護装備の適正化検討																
			(予定) ・管理対象区域の運用区分及び放射線防護装備の適正化検討※ (運用範囲の拡大等) ※管理対象区域を3つのゾーンに区分し、休憩所や装備交換所で、各区分に応じた防護装備を着用することで、作業時の負荷軽減による安全性と作業性の向上を図る。	現場作業 管理対象区域の運用区分に応じた放射線防護装備の適正化																
人身安全	2	重傷災害撲滅、全災害発生状況の把握	(実績) ・協力企業との情報共有、安全施策の検討・評価 ・安全推進協議会の開催：災害事例等の再発防止対策の周知等 ・作業毎の安全施策の実施(TBM-KY等) ・熱中症予防対策(5~9月)の実施	現場作業 情報共有、安全施策の検討・評価																
			(予定) ・協力企業との情報共有、安全施策の検討・評価 ・安全推進協議会の開催：災害事例等の再発防止対策の周知等 ・作業毎の安全施策の実施(TBM-KY等) ・福島第一原子力発電所における熱中症予防対策の実施状況報告	現場作業 熱中症予防対策(5~9月)の実施 新規追加 福島第一原子力発電所における熱中症予防対策の実施状況報告(10/26)▼																
健康管理	3	長期健康管理の実施	(実績) ・検査対象者・医療機関等からの問い合わせ対応及び検査費用の精算手続き ・2017年度対象者(社員)への「白内障検査」(福島)実施	現場作業 健康相談受付																
			(予定) ・検査対象者・医療機関等からの問い合わせ対応及び検査費用の精算手続き ・2017年度対象者(社員)への「白内障検査」(柏崎刈羽)実施 ・2017年度対象者(社員)への「白内障検査」(本社)実施 ・インフルエンザ予防接種の実施(10/25~1/31 1F構内臨時会場、近隣医療機関)	現場作業 【検査受診期間】検査対象者・医療機関等からの問い合わせ対応及び検査費用清算手続き 社員・白内障検査(柏崎刈羽) 社員・白内障検査(本社) インフルエンザ予防接種の実施																
労働環境改善	4	継続的な医療職の確保と患者搬送の迅速化	(実績) ・1F救急医療室の2017年12月までの医師確保完了(固定医師1名+0-7ヶ月支援医師)	現場作業 1F救急医療室12月までの医師確保完了																
			(予定) ・1F救急医療室の1~3月の勤務医師調整	現場作業 1F救急医療室の1~3月の勤務医師調整																
要員管理、労働環境改善	5	作業員の確保状況と地元雇用率の実態把握	(実績) ・作業員の確保状況と地元雇用率についての調査・集計	検討・設計 ▼作業員の確保状況調査依頼 作業員の確保状況集約▼ ▼作業員の確保状況調査依頼 作業員の確保状況集約▼ ▼作業員の確保状況調査依頼 作業員の確保状況集約▼ ▼作業員の確保状況調査依頼																
			(予定) ・作業員の確保状況と地元雇用率についての調査・集計	検討・設計 作業員の確保状況(9月実績/11月予定)と地元雇用率(9月実績)についての調査・集計 作業員の確保状況(10月実績/12月予定)と地元雇用率(10月実績)についての調査・集計 作業員の確保状況(11月実績/1月予定)と地元雇用率(11月実績)についての調査・集計																
要員管理、労働環境改善	6	労働環境・生活環境・就労実態に関する企業との取り組み	(実績) ・労働環境・生活環境・就労実態に関する意見交換及び実態把握 ・意見交換及び実態把握に基づく解決策の検討・実施・結果のフィードバック ・相談窓口への連絡(処遇・労働条件等)への対応 ・作業員へのアンケートによる実態把握(第8回)	検討・設計 労働環境・生活環境・就労実態に関する意見交換及び実態把握、解決策の検討・実施・結果のフィードバック																
			(予定) ・労働環境・生活環境・就労実態に関する意見交換及び実態把握 ・意見交換及び実態把握に基づく解決策の検討・実施・結果のフィードバック ・相談窓口への連絡(処遇・労働条件等)への対応 ・作業員へのアンケートによる実態把握(第8回)	現場作業 配布(9/28~) 回収(10月下旬) 公表(12月下旬) 協力企業との意見交換会(12月初旬)▼ 協力企業との意見交換会(12月下旬)▼ 作業員へのアンケートによる実態把握(第8回)																
車両点検整備	7	構内専用車両の点検整備	(実績) ・未点検の構内専用車両の整備計画の検討・策定 ・未点検の構内専用車両の整備の実施	検討・設計 未点検の構内専用車両の整備計画の検討・策定(11月分)																
			(予定) ・未点検の構内専用車両の整備計画の検討・策定 ・未点検の構内専用車両の整備の実施	現場作業 未点検の構内専用車両の整備の実施																

分野名	活の	作業内容	これまで1ヶ月の動きと今後1ヶ月の予定			9月					10月					11月					12月		1月		備考
			24	1	8	15	22	29	5	12	19	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下				

労働環境改善

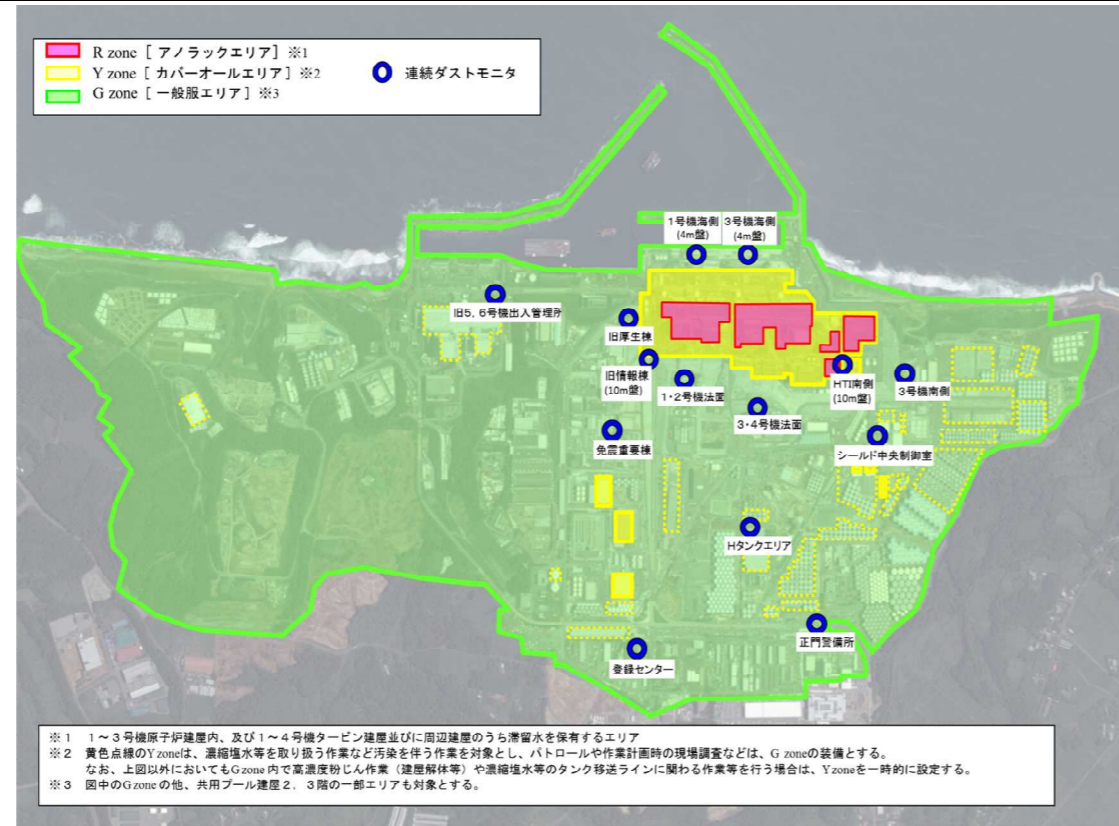

管理対象区域の運用区分 レイアウト

提供：日本スペースイメージング, ©DigitalGlobe
