

梁取地区における高収益作物導入の取組について

農地中間管理機構関連農地整備事業 梁取地区



- 事業名：農地中間管理機構関連農地整備事業
- 地区名：梁取地区(南会津郡只見町大字梁取地内)
- 工期：令和4年度～令和9年度
- 事業費：1,894,000千円(国62.5% 県27.5% 町10%)
- 事業量：

・農業生産基盤整備事業

整地工A=50.1ha(田39.5ha、畑10.6ha)
 客土工A=41.8ha、道路工L=10.4km、
 用水路工L=5.2km(開水路0.5km、PL4.7km)、
 排水路工L=9.0km

・農業生産基盤整備附带

ハウス移転一式

・営農環境整備

井戸新設一式、営農供給施設一式



現在の工事状況




整備前



南郷トマト

計画図

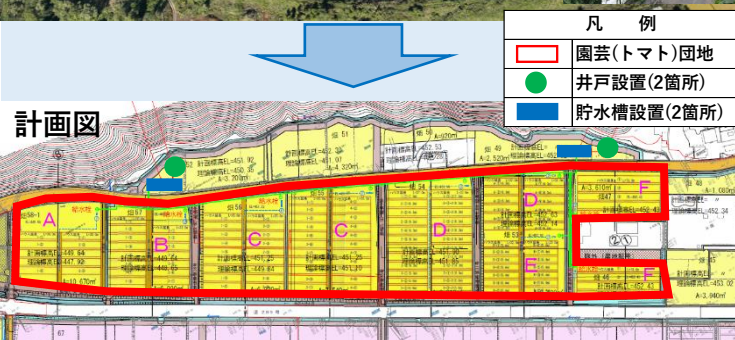

	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度	R8年度	R9年度	備考
農業生産基盤整備事業		測量設計	区画整理工		補完工		本事業
農業生産基盤整備附带			ハウス移転				本事業
営農環境整備			井戸新設 営農供給施設				本事業
園芸生産拠点育成支援事業等			ハウス新設				他事業

①ハウスの移転・新設

- 担い手の要望に応じた園芸施設数・規模・配置を調整
- 既存のトマトハウスを活用し休作せずにトマトハウスの撤去、移設、更新を調整
- 園芸生産拠点育成事業等の事業期間と調整



②井戸新設等

- R5年度の揚水調査により計画量を把握し設計に反映
- 畑地灌漑施設整備として、「貯水槽+井戸ポンプ」を2箇所整備し、PLで配送を計画
- ※R6年度整備完了予定



③客土材

- トマトに適した作土に向け、県普及所・整備部職員が連携しながら土取場や土質を調整
- 他事業(県建設事務所、電源開発(株)等)と調整しながら客土工の所要量(V=4万m³)を確保

