

新しい道路を造っています。

【全体計画】

道路改良 L=2.2km
W=13.0 (25.0) m


- ・ 橋梁工 N=1箇所
- ・ ボックスカルバート N=3箇所

【H26工事概要】

路体盛土 L=407m
V=11,200m³

【現場状況】

部分供用予定
 (県道会津若松三島線
 ~県道橋本会津高田線)
平成28年度

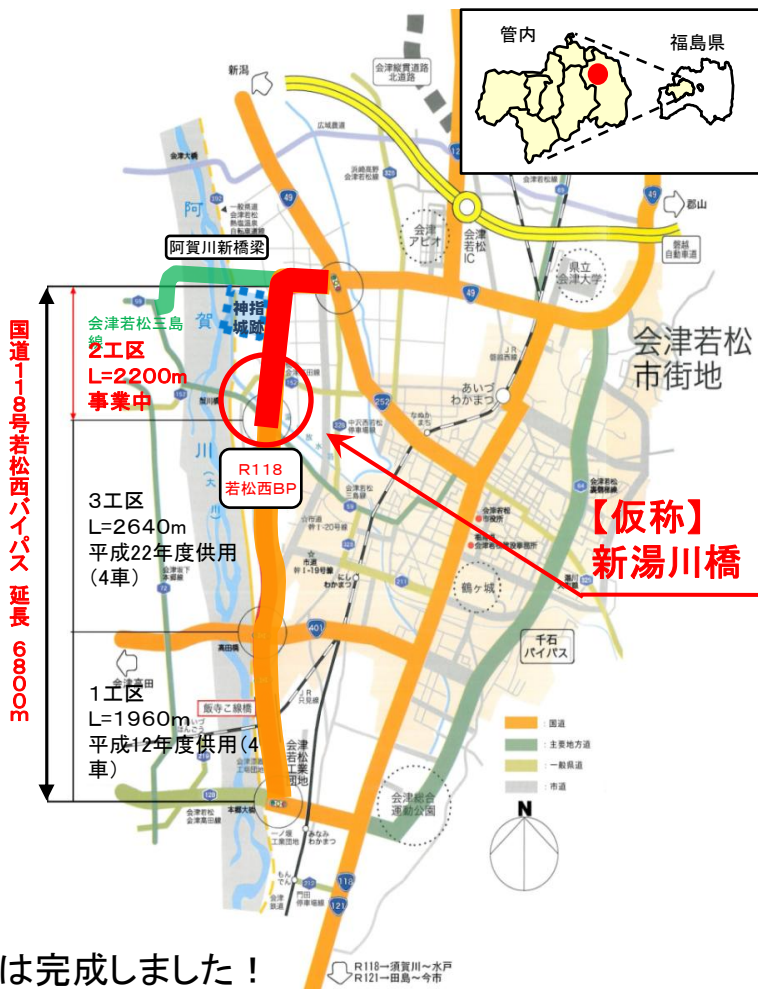

橋梁下部工(A2橋台)及び路体盛土工は完成しました！
 9月中旬から側溝工・暗渠工を施工する予定で、10月中旬には完了する見込みです。

8月28日
湯川北側の状況



8月28日
法面の繁茂状況



※橋梁下部工・・・橋の土台部分のことです。
 ※路体盛土・・・道路を盛土して造る場合の基礎となる部分のことです。



※この事業に関するお問い合わせ先
 会津若松建設事務所 道路課 TEL)0242-29-5440
